


# 從事電梯機坑清潔作業時 發生**墜落**危害案例

## 案情摘要

111年5月22日於桃園區某集合住宅新建工程，從事電梯機坑清潔作業，作業過程中發生墜落災害，該名工作者被發現倒臥於電梯機坑內部之死亡事件。



## 肇災原因

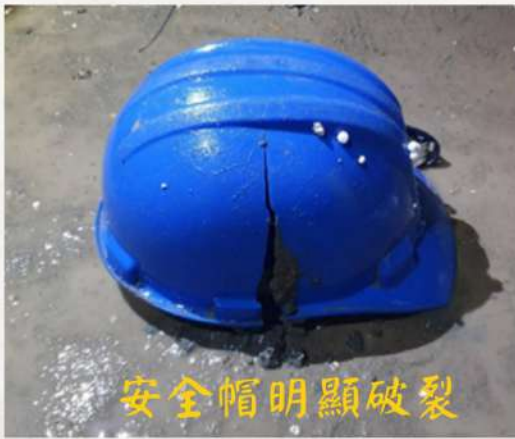

安全帽明顯破裂

雇主使勞工於無障礙電梯井、電梯機坑工作場所作業前，未實施危害調查、評估、未訂定墜落災害防止計畫，且未設置防止墜落災害之警示，致發生工作者墜落致死職業災害。

## 防災對策

1. 雇主應指派專任工程人員或工地負責人，於作業前實施危害調查及風險評估。
2. 高度2公尺以上電梯井場所，應訂定墜落災害防止計畫
3. 對於電梯井、機坑區域等有墜落之虞之場所，除必要之護欄設施，亦應設置防止墜落災害之警示。
4. 電梯機坑清潔作業應落實監督巡視，避免勞工單獨作業。

## 企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。

