


從事天花板安裝初級濾網作業時 發生墜落危害案例

案情摘要

111年7月2日新建工程，勞工從事無塵室天花板安裝FFU（過濾風扇單元）上的初級濾網作業，天花板護蓋未牢固在框架內，造成罹災者發生墜落災害。



肇災原因

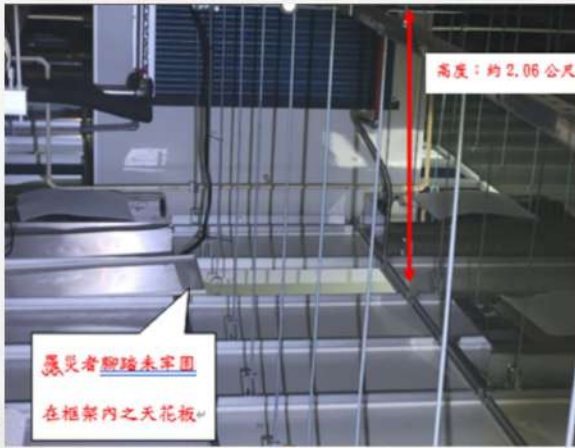

作業人員於3樓碳鋼合金之天花板護蓋上移動時，墜落口之天花板護蓋未牢固在框架內，造成腳踏之天花板護蓋彈開，導致罹災者發生墜落災害。

防災對策

1. 雇主設置之護蓋，應以有效方法防止滑溜、掉落、掀出或移動。
2. 機械、設備、器具、原料、材料等物件之設計、製造或輸入者及工程之設計或施工者，應於設計、製造、輸入或施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於使用或工程施工時，發生職業災害。

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失刑責。
2. 影響公司企業及雇主名譽與社會觀感。
3. 災害衝擊其他工作者心理，降低工作效率，降低勞動力。
4. 造成工程進度延宕及施工成本提高。

