營建剩餘土石方材料回填施工流程圖

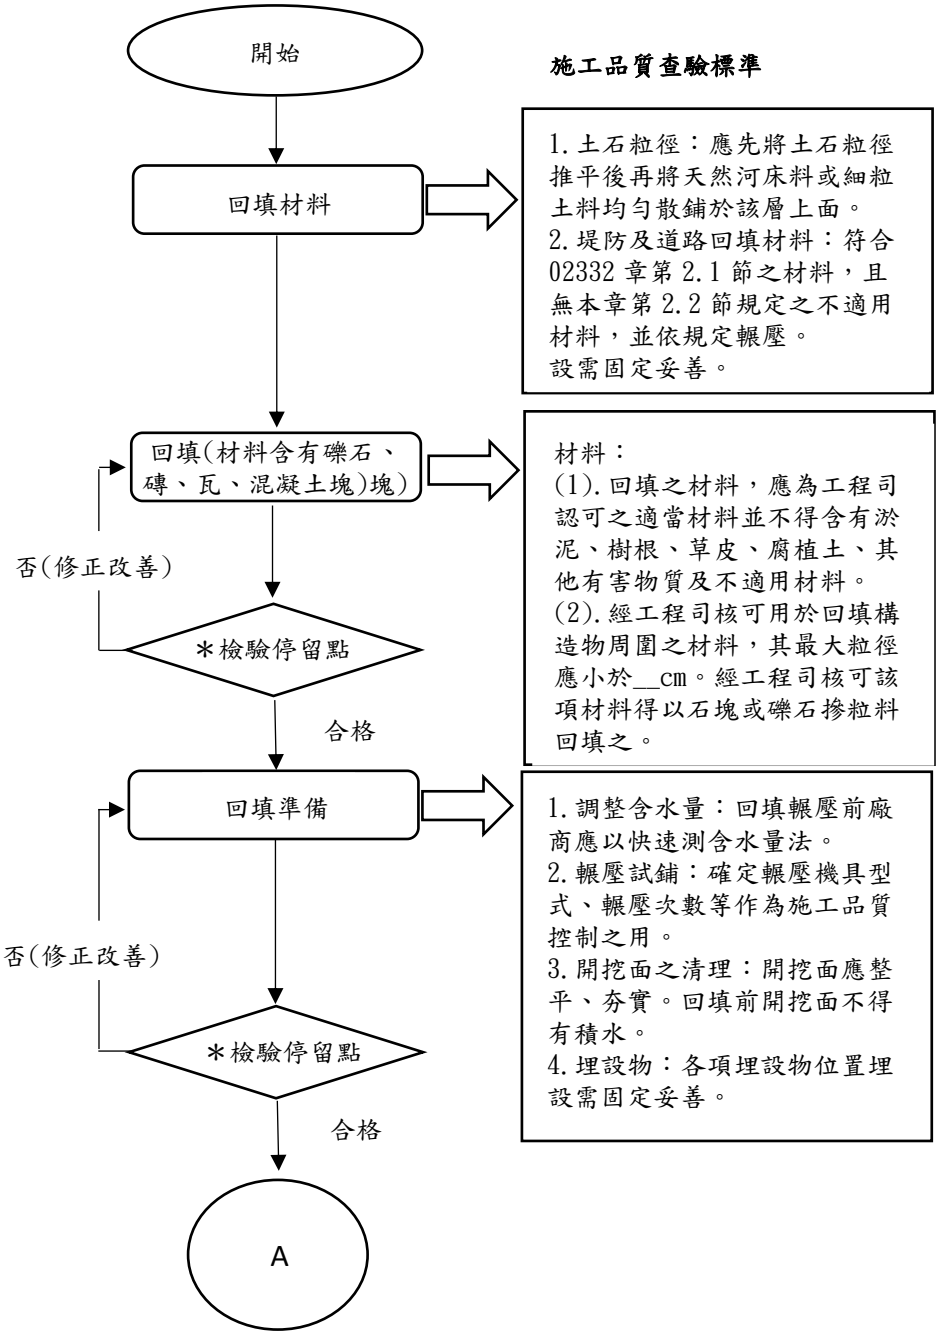

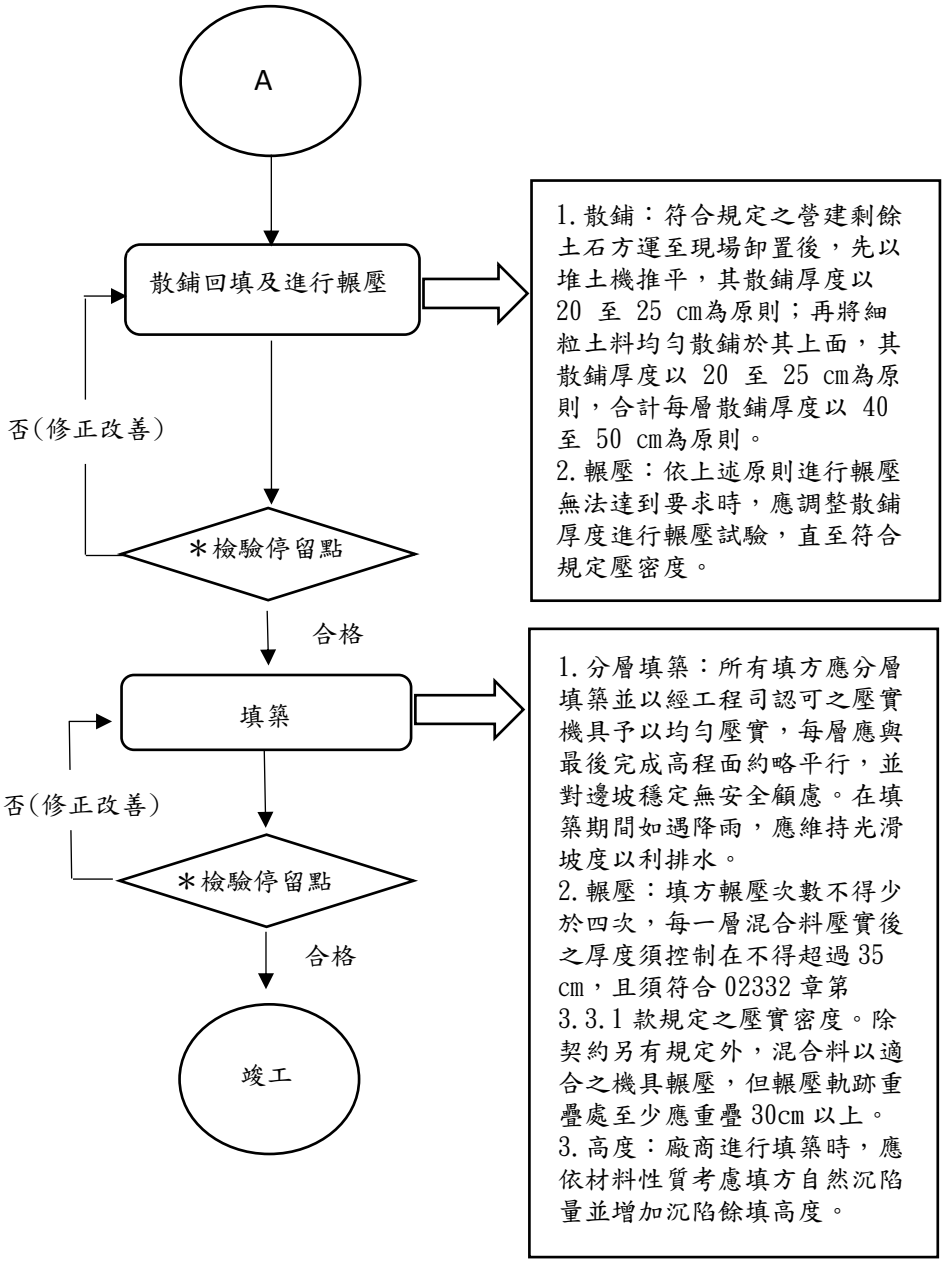
A
散鋪回填及進行輾壓
1.散鋪：符合規定之營建剩餘土石方運至現場卸置後，先以堆土機推平，其散鋪厚度以 20 至 25 cm為原則；再將細粒土料均勻散鋪於其上面，其散鋪厚度以 20 至 25 cm為原則，合計每層散鋪厚度以 40 至 50 cm為原則。
2.輾壓：依上述原則進行輾壓無法達到要求時，應調整散鋪厚度進行輾壓試驗，直至符合規定壓密度。
否(修正改善)
＊檢驗停留點
合格
填築
1.分層填築：所有填方應分層填築並以經工程司認可之壓實機具予以均勻壓實，每層應與最後完成高程面約略平行，並對邊坡穩定無安全顧慮。在填築期間如遇降雨，應維持光滑坡度以利排水。
2.輾壓：填方輾壓次數不得少於四次，每一層混合料壓實後之厚度須控制在不得超過 35 cm，且須符合 02332 章第 3.3.1 款規定之壓實密度。除契約另有規定外，混合料以適合之機具輾壓，但輾壓軌跡重疊處至少應重疊 30cm 以上。
3.高度：廠商進行填築時，應依材料性質考慮填方自然沉陷量並增加沉陷餘填高度。
否(修正改善)
＊檢驗停留點
合格
竣工
