



桃園市公共工程精進事項

桃園市政府工務局

報告人：黃全成 科長

107年12月13日

簡報大綱

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 簡化工程查核流程
- 工程履約績效納入評選審查機制
- 預拌混凝土廠實地廠驗
- 查核案件常見錯誤態樣

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 簡化工程查核流程

(一) 簡化工程查核流程已於107年6月14府工施字1070144462號函公告實施。

項目	作業流程	修正前	修正後	備註
1.	人員介紹+簡報	30分	15分	
2.	工程查詢紀錄表(領隊)		5分	新增項目
3.	現場會勘	60分	80分	
4.	書面資料查閱	30-60分	20分	
5.	查核檢討會議	30分	30分	
6.	扣點檢討會	10分	5分	
合計		160~190分	155分	

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 簡化工程查核流程

(二)簡報內容由業主統一彙整成1份，查核時分別由各主管人員辦理簡報。(紙本統一以橫向A4雙面格式，一面一張簡報，長邊裝訂)

- 一、施工團隊介紹
- 二、工程概要
- 三、工程管理人員提報登錄
- 四、工程查核/督導執行情形
- 五、工程查核/督導提出缺失及追蹤表
- 六、工程障礙
- 七、設計理念與功能
- 八、工法說明
- 九、各項計畫核定情形
- 十、工程進度
- 十一、主要工項及目前施作情形
- 十二、品質保證執行情形
- 十三、品質管制執行情形
- 十四、職業安全衛生管理
- 十五、環境監測及土方管制情形
- 十六、主任技師督察情形

主辦機關及
專案管理單位

設計及監造單位

承攬廠商

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 簡化工程查核流程

(三)「工程查詢紀錄表」預先由工程主辦機關填寫，於查核時交予施工查核小組，紀錄表由領隊於會中宣讀供各委員參酌，以利府頒法令規定有效落實。

桃園市政府施工查核小組

工程查詢紀錄表

1071107 版

標案名稱：

日期：

項次	查詢項目	查詢結果	備註
壹、共同查詢事項	一 職安查詢事項		
	(一) 有無將「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」納入勞務契約中執行	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無將「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」納入工程契約中執行	☐ 有 ☐ 無	
	(三) 設計時有無實施工程風險評估	☐ 有 ☐ 無	
	(四) 編列職安預算經費時有無依據風險評估量化	☐ 有 ☐ 無	
	(五) 施工前施工廠商有無實施施工安全評估、確認危害因子提出防範措施	☐ 有 ☐ 無	
	(六) 施工中有無執行「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」附件四與附件五表列查驗	☐ 有 ☐ 無	
	二 設計審查查詢事項	☐ 有 ☐ 無	
	(一) 有無針對業主需求提出設計	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無針對管理維護提出設計	☐ 有 ☐ 無	
	(三) 有無辦理試挖、試鑽等地質調查狀況	☐ 有 ☐ 無	
	(四) 有無變更設計	☐ 有 ☐ 無	
	三 開工前有無辦理開工前講習與說明會	☐ 有 ☐ 無	
	四 空污防制具體作為有無量化	☐ 有 ☐ 無	
	五 有無導入 BIM 設計	☐ 有 ☐ 無	
	六 有無使用創新平台(新材料、新工法)回饋循環經濟、環保節能減碳	☐ 有 ☐ 無	
	七 有無規定混凝土膠材飛灰、爐石使用上限及配比如何 (參考：僅使用飛灰時，飛灰用量不得超過膠結材料重量之 25%，僅使用水淬高爐爐渣粉時，水淬高爐爐渣粉用量不得超過膠結材料重量之 50%，僅使用砂灰時，砂灰用量不得超過膠結材料重量之 10%，飛灰、水淬高爐爐渣粉及砂灰混用做為膠結材料時，飛灰、水淬高爐爐渣粉及砂灰總量不得超過膠結材料重量之 50%，其中飛灰不得超過 15%)	☐ 有 ☐ 無	
	八 有無水保計畫	☐ 有 ☐ 無	
	九 有無將「桃園市政府委託技術服務履約績效管理作業要點」點納入招標文件	☐ 有 ☐ 無	
	十 有無將本市公共工程施工圖樣版9式，納入所轄工程參照運用(107年1月10日府工綜字第1060308216號)	☐ 有 ☐ 無	
	十一 有無將行政院環境保護署「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」納入契約參照運用(107年5月17日環衛字第1070039023號)	☐ 有 ☐ 無	
	十二 有無將「施工網要規範第3050章 混凝土基本材料及施工一般要求」1.5.2節納入契約中執行。	☐ 有 ☐ 無	

桃園市政府施工查核小組

工程查詢紀錄表

1071107 版

項次	查詢項目	查詢結果	備註
貳、工程專業類別查詢事項	一 土木類		
	(一) 有無土木工法展示	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無道路基礎改善或新設路基	☐ 有 ☐ 無	
	二 建築類		
	(一) 有無建築防火計畫、防水計畫	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無磁磚計畫	☐ 有 ☐ 無	
	(三) 鋼構有無採鍍鋅防鏽、防蝕措施	☐ 有 ☐ 無	
	(四) 有無編定日後維護保養使用手冊	☐ 有 ☐ 無	
	三 水利類		
	(一) 有無水流速度及流量相關計算	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無集水面積相關計算(滯洪池)	☐ 有 ☐ 無	
	四 機水電類		
	(一) 有無工廠驗廠及廠驗之單機測試	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無機水電接地措施	☐ 有 ☐ 無	
	五 景觀類		
	(一) 有無評估換土或改良土壤	☐ 有 ☐ 無	
	(二) 有無植栽遷移計畫	☐ 有 ☐ 無	
參、其他	一 有無督導小組及督導事項	☐ 有 ☐ 無	

領隊：_____

工程主辦機關代表：_____

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 簡化工程查核流程

(四)陳列文件減量，由全工程時段之相關文件，改採陳列最新核定、累計表、兩週內或最新核定之文件。

陳列文件(計畫書、總表)

項次	文件名稱	說明
1	契約書	含工程圖說及設計規範
2	監造計畫	最新核定版
3	施工計畫	最新核定版
4	工程要徑表	最新核定
5	整體品質計畫	最新核定版
6	分項品質計畫	已核定部分
7	職業安全衛生管理計畫	最新核定版
8	營建剩餘土石方處理計畫	最新核定版
9	防汛計畫	最新核定版
10	交通安全維持計畫	最新核定版
11	工程檢驗停留點	累計表
12	工程施工材料試驗管制總表	累計表
13	材料設備送審管制總表	累計表
14	材料檢(查、試)驗紀錄統計表	累計表

陳列文件(其他表單)

項次	文件名稱	說明
1	公共工程建築物施工日誌及技術士簽章表	兩週內
2	公共工程監造報表或建築物監造(監督、查核)報告表	兩週內
3	各項工項自主檢查表	兩週內
4	各項材料試驗報告	兩週內或最近一次
5	工作月報表	最近月份
6	監造月報表	最近月份
7	監造日報表	兩週內
8	主辦機關督導紀錄及改善成果	最後一次
9	各項工項施工品質查驗紀錄	兩週內或最近一次
10	各項材料設備備查紀錄	最新
11	職業安全一般性作業安全衛生查驗表	兩週內或最近一次
12	職業安全查驗點檢查表	最新
13	職業安全教育訓練資料	兩週內或最近一次
14	工程風險評估	最新
15	防汛演練紀錄	兩週內或最近一次
16	各工項材料設備廠驗資料	最近一次
17	施工缺失改善矯正及預防措施	最近一次
18	估驗計價資料	最近一次
19	專任工程人員督察紀錄表	兩週內
20	剩餘土石方流向紀錄	兩週內或最近一次
21	施工協調會	兩週內或最近一次
22	材料出廠證明	最近一次
23	設備出廠證明	最近一次

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

目的

- ◎為遴選具履約能力之優質廠商參與國家建設，提升公共工程品質及進度。
- ◎解決最低標決標衍生之工程延宕及採購爭議。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

適用範圍(1/2)

◎本府工務局、水務局、交通局、都市發展局、捷運工程局、新建工程處、養護工程處、住宅發展處及本府所屬各區公所(復興區公所除外)依政府採購法以最有利標方式辦理之工程案件，應將本方案納入招標文件作為採購評選作業之依據。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

適用範圍(2/2)

◎機關辦理工程採購，其金額達**查核金額以上**者，應考量工程之異質性，決標方式以**評分及格最低標**或**最有利標**為原則，並依本方案將廠商過去承攬工程之履約績效，納入評選作業評分之表廠商過去履約績效評選項目，工作小組應將受評廠商之廠商整體履約計分、施工查核成績、重大職災、停權情形及獲獎情形等資料納入初審意見。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

方法

- ◎在辦理評選作業時，應依參加投標廠商近年之工程查核總平均分數、公共工程重大職災及獲獎情形，以附表一規定予以加、減分。
- ◎投標廠商近年之工程查核總平均分數、公共工程重大職災、金質獎、金安獎及金品獎獲獎情形，機關可分別於公共工程標案管理系統、勞動部與本府網頁公告資料查詢。
- ◎方案各增減項目所稱近年履約情形資料，以截止投標日為基準日往前推算為準。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

附表一：增減分項目標準表

近五年施工查核情形 查核總平均 (X)	90 ≤ X 加 3分		78 ≤ X < 80 扣0.5分		
	88 ≤ X < 90 加2.5分		76 ≤ X < 78 扣 1分		
	86 ≤ X < 88 加 2分		74 ≤ X < 76 扣1.5分		
	84 ≤ X < 86 加1.5分		72 ≤ X < 74 扣 2分		
	82 ≤ X < 84 加 1分		70 ≤ X < 72 扣2.5分		
	80 < X < 82 加0.5分		X < 70 扣 3分		
	近五年公共工程重大職災情形		扣1分/次 (最多以扣5分為限)		
近期獲獎情形		特優(2年)	優等(1年)	佳作或入圍(1年)	
	金質獎、金安獎	加1.5分	加1分	加0.5分	
	金品獎	加1.5分	加1分	加0.5分	

註：以上加、減分累計最高加6分，最高減6分。

(同一廠商榮獲金質獎、金安獎僅限擇優加分1次)

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

分數規定(1/2)

- ◎廠商過去履約績效之評選項目，機關得考量個案之特性，訂定該項之分數及合格分數，並依附表二所列項目計算之。
- ◎評選委員評分後之平均分數且經加減分後未達前項之合格分數者，不得列為決標對象。但經評選委員會決議，不將此規定作為決標對象之標準者，不在此限。
- ◎第一項之合格分數未於招標文件載明者，以第一項所訂分數之百分之八十為合格分數。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

分數規定(2/2)

- ◎機關以共同投標辦理工程採購案者，各成員應分別就其評選項目計算增減分後，再依共同投標協議書之比例計算。
- ◎辦理統包工程者，工程施工廠商應依本方案辦理評選事宜，統包團隊之技術服務廠商，機關應依桃園市政府委託技術服務履約績效管理作業要點辦理，不適用本方案。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 工程履約績效納入評選審查機制

附表二：

「○○○○○○○○○○○○○○○○」評選作業評分表

評選項目		廠商過去履約績效(35分)【註1】								○○○○	總分	
		a					實際分數 g =b+f	合格分數 [80 %] = 28 分 【註4】	是否得列 為決標對 象檢核 【註4】 g≥h: 是 g<h: 否	○○ ○○○ ○○ ○		
		廠商 過去 經驗 實績 (35分) b	廠商過去履歷加減分情形									
			近五年 施工查 核情形 【註2】 c	近五年 公共工 程重大 職災情 形 d	近五年 獲獎情 形 e	增減分 合計結 果 f =c+d+e						
配分權重 (滿分為100 分)		委員 評分	加分 或 減分	減分	加分		實際分數 【註3】			(○○分)		
廠商 名稱	1	A 廠商	30	+1	-1	+2	+2	32	28 (假設80%)	是		
	2	B 廠商	28	-1	-2	+0	-3	25	28 (假設80%)	否		
	3	C 廠商	31	+3	-0	+2	+5	35	28 (假設80%)	是		

1. 評選項目「廠商過去履約績效」項目配分建議為25分至35分。
2. 近五年施工查核情形接近五年查核總平均(X)計分，X=80分者不加減分，五年內未接受工程查核者，不加減分。
3. 「實際分數」為「委員評分」加計「增減分合計結果」，其最低為零分，最高為該「廠商過去履歷」評選項目配分之滿分。
4. 本評選項目機關得考量其配分之比例，於招標文件中規定經出席評選委員評分且經增減分後實際分數之平均分數，未達合格分數者，不得列為決標對象。
5. 計分標準依招標文件規定。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(1/7)

◎公共工程標案管理系統

<https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin>

公共工程標案管理系統
www.pcc.gov.tw

(本系統由執行單位填報)
請輸入使用者代號及密碼

1 使用者代號

密碼

2 登入系統 重新輸入

[加入我的最愛](#)

- (1).輸入帳號與密碼
- (2).點擊「登入系統」

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(2/7)

使用單位：桃園市政府 使用人員：

回入口 回前頁 公共工程標案管理資訊系統

1

標案資料登錄 標案查詢 統計分析

標案執行機關變更 重複標案併案 變更

新增所屬內部單位 專案追蹤列管 對照

施工查核季報 重大工安事件 全部

承攬廠商編號查詢 使用說明 使用

各機關聯絡人員 廠商帳號審查 標準

2

決策支援 長官想知道的

廠商分析 廠商承攬排行 規劃單位排行 設計單位排行

監造單位排行 規劃設計監造 CM單位排行

分包廠商資源表 廠商履歷表

標案報表 標案自選欄位表 標案統計表 標案明細簡表

專案列管明細 管考進度表 委託或補助案

標案期程表 復建工程請款表 保證金管控表

進度查證表 驗收資料表 滿意度調查表

履約情形計分 標案開工要件 工地預拌設備

大宗營建資材

(1).點擊「統計分析」

(2).點擊「廠商履歷表」

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(3/7)

廠商承攬公共工程履歷

1

請輸入廠商名稱並點選開始查詢鍵查尋資料

廠商名稱關鍵字

請輸入圖內顯示驗證碼(大小寫不拘)

67PNs

[重新取碼](#)

2

為預防程式針對本系統進行大量查詢之投機行為，
影響系統服務品質，保障您的權益，請輸入驗證碼。

3

開始查詢

清除條件

公共工程履歷應用於政府採購作業參考手冊(106.7.18)

(1).輸入廠商名稱

(2).輸入驗證碼

(3)點擊「開始查詢」

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(4/7)

股份有限公司公共工程履歷資料

列表日期：107年11月21

項目	施工工程發包預算金額				備註
	2億以上	5000萬至2億	1000萬至5000萬	100萬至1000萬	
(1)近5年承攬施工件數	21	0	3	0	明細
(2)近5年專案管理件數	0	0	0	0	
(3)近5年監造件數	0	0	0	0	
(4)在建工程件數	14	0	2	0	明細
(5)近5年被查核等第及次數	優等	0	0	0	明細
	甲等	26	1	0	
	乙等	0	0	0	
	丙等	0	0	0	
(6)近5年公共工程金質獎得獎次數	特優	0	0	0	明細
	優等	1	0	0	
	佳作	0	0	0	
	入圍	0	0	0	
(7)近5年承攬施工發生重大職災件數	3	0	0	0	明細
(8)近5年履約計分結果	86.64	--	81.10	--	
整體履約計分結果	85.85				明細
107年11月 廠商履約計分PR指標	(1)頂標：81.6分；(2)前標：80.9分；(3)均標：80分； (4)後標：79.1分；(5)底標：77.82分。				

(1).找到「近五年被查核等第及次數」

(2).點擊「明細」

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(5/7)

工程股份有限公司最近五年被查核之公共工程標案 (依查核日期排序)

列表日期：107年11月21日

查核日期	查核小組	工程名稱	主辦單位	開工日期	設計單位	專案管理	管理扣點	監造單位	監造扣點	承攬廠商	承攬扣點	評分
107 09 21	臺北市府	LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程	臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第三工務所	103 12 11	台灣世曦工程顧問股份有限公司	--		臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第三工務所		工程股份有限公司	1	83
107 08 27	臺北市府	國家會展中心(南港展覽館擴建)PC07地下連通道設置整建工程(機電工程)	台灣電力股份有限公司營建處南港專案小組	106 10 01	潘冀聯合建築師事務所	亞新工程顧問股份有限公司		潘冀聯合建築師事務所		工程股份有限公司		81
107 06 05	交通部	台9線蘇花公路仁水隧道新建工程	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	103 06 17	中興工程顧問股份有限公司	--		中興工程顧問股份有限公司		工程股份有限公司		85
107 05 22	中央工程施工查核小組	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站設計畫CM01區段標	交通部鐵道局北部工程處第三工務段	102 12 28	台灣世曦工程顧問股份有限公司	--		台灣世曦工程顧問股份有限公司		工程股份有限公司		84
107 05 16	交通部	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程	臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	101 12 31	中興工程顧問股份有限公司	--		臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所		工程股份有限公司		84

查核責任扣點總數：7點，查核平均成績：83.3

便會顯示五年內標案成績，右下即有近五年查核平均成績

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核職災查詢(6/7)

股份有限公司公共工程履歷資料

列表日期：107年11月21日

項目		施工工程發包預算金額				備註
		2億以上	5000萬至2億	1000萬至5000萬	100萬至1000萬	
(1)近5年承攬施工件數		21	0	3	0	明細
(2)近5年專案管理件數		0	0	0	0	
(3)近5年監造件數		0	0	0		
(4)在建工程件數		14	0	2		
(5)近5年被查核等級及次數	優等	0	0	0		
	甲等	26	0	1		
	乙等	0	0	0		
	丙等	0	0	0		
(6)近5年公共工程金質獎得獎次數	特優	0	0	0		
	優等	1	0	0		
	佳作	0	0	0	0	明細
	入圍	0	0	0	0	
(7)近5年承攬施工發生重大職災件數		3	0	0	0	明細
(8)近5年履約計分結果		86.64	--	81.10		
整體履約計分結果		85.85				明細
107年11月 廠商履約計分PR指標		(1)頂標：81.6分；(2)前標：80.9分；(3)均標：80分； (4)後標：79.1分；(5)底標：77.82分。				

- (1).找到「近5年承攬施工發生重大職災件數」
- (2)點擊「明細」

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

廠商近五年查核成績及職災查詢(7/7)

股份有限公司近五年承攬施工發生重大職災之公共工程 (依發生日期排序)

列表日期：107年11月21日

勞動部 核定 日期	發生 日期	工程名稱	工程主辦機關	專案管 理單位	監造單位	施工廠商名 稱	罹災時作業災情	災害 類型	死	傷	縣市 別
1 1050906	1050504	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程	臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所		臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	股份有限公司	勞工陳○明於4樓頂板進行模板鋪設作業時不慎自開口邊緣摔落至4樓地面死亡	墜落、滾落	1	0	台中市北屯區
2 1050104	1040725	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標	交通部鐵道局北部工程處第三工務段		台灣世曦工程顧問股份有限公司	股份有限公司	許○漢於擋土支撐作業遭型鋼壓到送醫不治死亡。	物體飛落	1	0	桃園市中壢區
3 1030319	1021231	CL314標山里隧道至台東站路段土建工程	交通部鐵道局東部工程處第三工務段		中興工程顧問股份有限公司	股份有限公司	勞工陳○魁於工地切除鋼構施工便道頂棚時不慎自高約5公尺之頂棚墜落且被鋼板壓住頭部死亡	物體飛落	1	0	台東縣卑南鄉

本資料係完整呈現該廠商曾經承攬標案之履約過程資料，相關責任歸屬認定可參酌勞動部職業安全檢查機關之災害檢查報告書

便會顯示五年內職災情形

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金質獎得獎名單查詢(1/2)

◎搜尋:公共工程金質獎

https://www.pcc.gov.tw/Content_List.aspx?n=16D7DECD4329DFFC



一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金質獎得獎名單查詢(2/2)

The screenshot displays the website of the Public Construction Commission (行政院公共工程委員會). The header includes the commission's name and logo, along with navigation links for '關於本會', '重要政策', '政府採購', '工程技術', '工程管理', and '服務園地'. A search bar is present with the text '公共工程金質獎、工程技術顧問公司'. The main content area is titled '公共工程金質獎' and lists several links, including '金質獎頒發作業要點及修正總說明1060804核定版' and '金質獎頒發作業要點相關附件1060804核定版'. A red box highlights the links for the winning lists: '「第13屆金質獎」得獎名單', '「第14屆金質獎」得獎名單', '「第15屆金質獎」得獎名單', and '「第16屆金質獎」得獎名單'. A sidebar on the left contains a menu with items like '工程管理', '工程管理相關規定', '公共工程金質獎', '公共建設計畫執行', '品質查核', '活化閒置公共設施', and '全民督工'. Social media icons for Facebook, Google+, PTT, Twitter, and Line are visible on the right side of the page.

行政院公共工程委員會 人本·優質·永續
Public Construction Commission, Executive Yuan

關於本會 重要政策 政府採購 工程技術 工程管理 服務園地

公共工程金質獎、工程技術顧問公司 進階搜尋

公共工程金質獎

金質獎頒發作業要點及修正總說明1060804核定版

金質獎頒發作業要點相關附件1060804核定版

「第13屆金質獎」得獎名單

「第14屆金質獎」得獎名單

「第15屆金質獎」得獎名單

「第16屆金質獎」得獎名單

工程管理
工程管理相關規定
公共工程金質獎
公共建設計畫執行
品質查核
活化閒置公共設施
全民督工

即有歷年金質獎得獎名單

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金安獎得獎名單查詢(1/2)

◎ 搜尋:推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔

<https://www.osha.gov.tw/1106/1119/1161/1151/>



一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金安獎得獎名單查詢(2/2)

**勞動部職業安全衛生署**
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

回首頁 | 網站導覽 | RSS | English | 意見信箱(勞檢申訴) | 雙語辭彙

字級: 小 中 大

請輸入文字  

職業災害預防 | 勞工健康 | 勞動檢查 | 過勞認定 | 職業災害勞工補助

本署介紹 | 新聞與公告 | 安全衛生 | 勞動檢查 | 職災保護 | 便民服務 | 法規專區

職業安全衛生獎項

國家職業安全衛生獎

推行職業安全衛生優良單位及人員

推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔

現在位置: 首頁 / 安全衛生 / 職業安全衛生獎項

推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔

共 12 筆資料, 第 1/2 頁, 每頁顯示 10 筆

 **1**  

即有歷年金安獎得獎名單  顯示條件查詢

標題	發布日期	最後異動日期
107年推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔	107-01-17	107-11-14
106年推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔	106-07-28	107-01-15
105年推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔	105-01-27	106-06-14
104年推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔	104-02-05	105-06-15

勞動部所屬機關

職業安全衛生管理單位及人員設置報備系統

勞工健康保護管理報備資訊網

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金品獎得獎名單查詢(1/2)

◎搜尋:桃園市政府金品獎專區

<http://pwb.tycg.gov.tw/home.jsp?id=364&parentpath=0,120>



一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

金品獎得獎名單查詢(2/2)



桃園市政府工務局
Department of Public Works, Taoyuan

二 回首頁 | 網站導覽 | 市政信箱 | 常見問答 | English | 桃園市入口網站

全站搜尋

訊息公告 認識工務局 機關通訊錄 業務資訊 便民服務 工程查核 政府資訊公開 廉政服務專區

目前位置: 首頁 > 業務資訊 > 金品獎專區

金品獎專區

發布日期 起 ~ 迄 (日期輸入格式: 106-01-01) 標題

日期	標題	發布單位
107-11-08	108年金品獎宣導影片	工程施工科
107-11-08	107年金品獎成果影片	工程施工科
107-11-08	107年桃園市政府第二屆公共工程金品獎得獎名單	工程施工科
107-11-08	106年桃園市政府第一屆公共工程金品獎得獎名單	工程施工科

即有歷年金品獎名單

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制-施工查核平台

查核平台入口(1/3)

將以上查詢簡化-施工查核平台

搜尋:桃園市政府資訊採購系統

網址:https://gpis.tycg.gov.tw/PwbTycg_Info/



一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制-施工查核平台

查核平台入口(2/3)

桃園市政府

登入Login

請輸入帳號(必填)

請輸入密碼(必填)

記住帳號密碼

忘記密碼? / 帳號重設

登入

法規查詢

採購文件範本

解釋函令查詢

教育訓練

採購申訴與履約調解

採購Q&A

採購稽核與施工查核

工項編碼

桃園市政府 採購資訊系統

最新消息

2018-09-26	工務局採購管理科	測試
2018-09-26	法務局採購申訴審議科	測試
2018-09-11	工務局採購管理科	有關附件檔案多筆上傳
2018-07-13	法務局採購申訴審議科	檔案上傳TEST180713
2018-02-15	法務局採購申訴審議科	5875

(1).輸入帳號及密碼

(2).點擊【登入】，
進入登入畫面

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制-施工查核平台

查核平台入口(3/3)


(3).點擊[工程施工查核管理平台]進入。



一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制-施工查核平台

廠商過去加減分

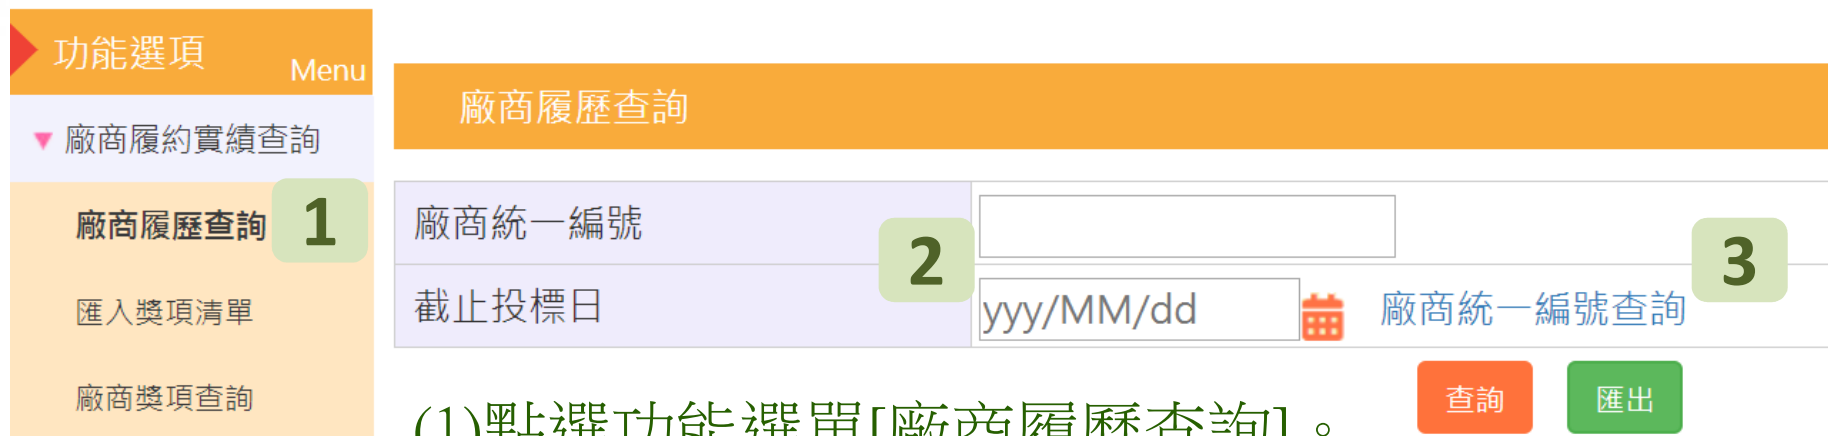

功能選項 Menu

▼ 廠商履約實績查詢

廠商履約實績查詢 1

匯入獎項清單

廠商獎項查詢

廠商履約實績查詢

廠商統一編號 2

截止投標日 3

yyy/MM/dd 廠商統一編號查詢

查詢 匯出

4 5

- (1)點選功能選單[廠商履約實績查詢]。
- (2)輸入廠商統一編號及截止投標日。
- (3)若不知廠商統一編號，可點選查詢。
- (4)點擊[查詢]，可瀏覽廠商履約實績資訊。
- (5)點擊[匯出]，可將查詢結果匯出。

廠商名稱	工程股份有限公司	統一編號	33020007
近五年施工查核情形	查核總平均 85.85分	+1.5	計算規則說明
近五年公共工程重大職災情形	每次事件	-3	計算規則說明
近期獲獎情形	金質獎、金安獎	+0	計算規則說明
	金品獎	+0.5	
總計		-1	

公共工程重大職災

序號	勞動部 核定日期	發生日期	工程名稱	工程主辦機關	監造單位	施工廠商	罹災時作業災情	災害 類型	死 (人)	傷 (人)	縣市別
1	105/09/06	105/05/04	臺北捷運局臺北車站機廠、G0站及全線軌道區段標工程	臺北市政府捷運工程局 二區工程處土木第六工務所	二區工程處土木第六工務所	工程股份有限公司	勞工陳○明於4樓頂板進行模板鋪設作業時不慎自開口邊緣摔落至4樓地面死亡	墜落、滾落	1	0	臺北市
2	105/01/04	104/07/25	臺中捷運局大車站設計及CM01區段標	交通部鐵道局北部工程處 第三工務段	顧問股份有限公司	工程股份有限公司	許○漢於擋土支撐作業適型鋼壓到送器不治死亡。	物體飛落	1	0	臺中市
3	103/03/19	102/12/31	路段土建工程	交通部鐵道局東部工程處 第三工務段	股份有限公司	工程股份有限公司	勞工陳○魁於工地切除鋼構施工便道頂棚時不慎自高約5公尺之頂棚墜落且被鋼板壓住頭部死亡	物體飛落	1	0	臺南市

近期獲獎情形明細

序號	得獎案名	獎項生效日期	獎項有效日期	獎項名稱	等第
1	台6線新橋路三永橋新建工程	107/09/10	108/09/20	金安獎	佳作或入圍

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 工程履約績效納入評選審查機制

重要期程

- ◎「桃園市政府投標廠商工程履約績效納入評選審查機制作業方案」已於107年11月29日府工施字第1070292027號函發布在案。
- ◎作業方案於108年1月1日起實施。
- ◎已於107年12月12日辦理本作業方案教育訓練。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 預拌混凝土廠實地廠驗

- (一)綱要規範第03050章V11.0-混凝土基本材料及施工一般要求

- 1.廠商應依據CNS 3090之規定提送有關混凝土組成材料來源及拌和計畫書，供工程司審核。該計畫書應說明拌和廠之型式、位置及所採用之拌和設備與單位產量。
- 2.供應單一工程混凝土總量大於[5000m³][]之拌和廠，其應檢附經政府機關、財團法人或學術機構等驗證單位依據CNS 3090驗證合格之證明文件，送交工程司審核通過後方得供料；驗證單位應通過依標準法授權之產品驗證單位認證機構認證。未經驗證合格廠商由工程司赴廠並依據CNS 3090至少辦理「材料計量」、「拌和廠」、「拌和機及攪拌機」、「拌和及輸送」等查驗並留存驗廠紀錄備查後，始得供料。
- 3.拌和廠經前（2）外單位驗證或工程司自行查驗合格後辦理品質查驗之頻率至少每年一次。

★未來將檢視各工程主辦機關是否依本規定辦理。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

- (一)查核當日缺席人員未見主辦機關核准請假公文或派代理人出席。
- (二)簡報(107年6月14府工施字1070144462號函公告實施)未依本小組提供格式統整、技師督察情形未親自說明。
- (三)未提供簡報紙本及受查書面資料給委員參考。
- (四)標案管理系統、簡報、工程執行資料表，填報資料不一致。
- (五)缺失改善未依期限回復，且未依規定申請展期。
- (六)第一次缺失改善准予備查之項目，第二次重覆回復。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

- 常見錯誤態樣

(七)現場材料抽驗試驗報告，未於文到3個工作日內將判讀結果函報本府。

(八)扣點懲罰性違約金未依契約規定繳予主辦機關，查核小組僅收市庫收入繳款書影本，作為繳款依據。

(九)本府工程施工查核小組係依政府採購法第七十條規定成立，爰代表本府辦理前開業務，相關資料未函復「桃園市政府」。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十)標案管理系統-基本資料未確實填報。

購地補償費：(無)千元		工程管理費：千元
空污費：千元	1.空汙費	空污徵收管制編號：(未填)
保險日期：自年月日至年月日		
保險費用：千元	2.保險資料	保險號碼：
履約保證金：75,000.000千元	繳納方式：銀行之書面連帶保證	
預定完工日期：年月日		實際完工日期：尚未完工
實際完成驗收日期：年月日		
預定決算日期：年月日		實際決算日期：年月日
結算金額：千元		決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：		
品質計畫核定日期：年月日	3.三大計畫資料	品質計畫核定文號：
監造計畫核定機關(單位)：		
監造計畫核定日期：年月日		監造計畫核定文號：
施工計畫核定機關(單位)：		
施工計畫核定日期：年月日		施工計畫核定文號：
承造廠商專任工程人員：(未填)	4.相關人員	工地相關人員：(未填)
規劃設計監造專技人員：(未填)		
品管人員：(未填)		監造現場人員：(未填)

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十一)標案管理系統-查核懲處表(D2)未逐項確實填報。

查核日期：107 年 04 月 24 日 查核單位：桃園市政府			
獎懲類別		查核單位建議	工程執行機關實際懲處
函請主辦機關依法檢討相關人員責任			否
對主辦機關	人員懲處	是	是 ☐
	人員獎勵	否	☐
	通知機關另為適當處置並副知審計機關		
對專案管理單位	函送監察院		
	辦理扣款	否	☐
對承攬廠商	依政府採購法第101條至第103條規定辦理	否	☐
	撤換工地負責人	否	☐ 還是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	撤換品管人員	否	☐ 還是時需先至品管人員(C3)填報撤換資料
	撤換安衛人員	否	☐ 還是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	檢討工地主任責任	否	☐
	檢討專任工程人員責任	否	☐
	缺失嚴重部分拆除重做	否	☐
	辦理扣款	否	否 ☐
對監造廠商	檢討建築師責任	否	☐
	檢討技師責任	否	☐
	委辦監造撤換監造現場人員	是	是 ☐ 還是時需先至監造現場人員(C3)填報撤換資料
	自辦監造懲處監工人員	否	☐
	辦理扣款	是	是 ☐
實際獎懲狀況摘要			

1.查核懲處表
逐項確實勾選，
不得留空

2.已勾選
部分說明
處置情形

(配合報表列印美觀，請於每段落後加按 **[Enter]** 鍵。)
 本案缺失改善資料逾期檢討相關責任為本處承辦人口頭警告1次，並依監造廠商品質保證規定扣罰2%之懲罰性違約金及更換監造人員。


● 常見錯誤態樣

2.無側標或側標未依缺失項目標號。



用大夾子夾好即可，紙本與光碟1式2份

2. 未黏貼側標

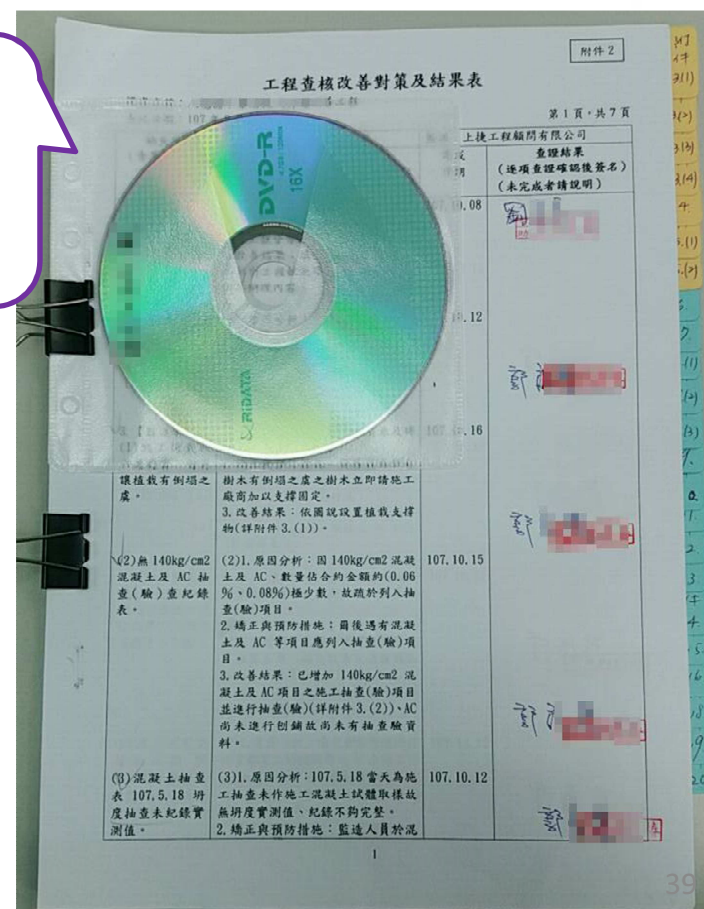

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十三)改善對策及結果表-1.缺失項目漏項。2.頁碼不得跳號。

附件 2

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：■■■■■■■■■■ 新建工程
查核日期：107.8.22.

第 1 頁共 3 頁

缺失項目 (含其他意見)	改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成 日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)
7. 工地安全衛生抽查應注意管控時機及重點，如：模板支撐、防護措施及邊境穩定...等，及安全檢查之頻率，如：每週檢查 2 次以上，對施工缺失之追蹤改善不完整，應從完成矯正預防措施，如：牆內預埋管線過於密集，未能按圖施作，且在限定期內廠商未有改善動作。	1. 原因分析：承包廠商對於圖說及施工相關流程不甚清楚。 2. 矯正與預防措施：於每周主工務會議中持續提醒說明。發文建議業主暫停廠商各項估驗及撥款至缺失改善為止。 改善結果：(1)加強工地安全衛生抽查時機，即日起改為每周檢查 2 次。(2)9 月份每周五工務會議提醒並催繳，並落實紀錄。(詳附件 6-3)。	107 年 9 月 21 日	
8. 進度落後嚴重，應督促廠商訂出適合之趕工計畫，盡力趕趕。	1. 原因分析：承包商對於所使用的工期及完成進度的計算不甚清楚。 2. 矯正與預防措施：本所已多次發文請廠商提交趕工計畫(詳附件 8-1)，但效果不彰，本所於九月份每周五工務會議提醒並催繳。 3. 改善結果：持續發文催繳並 9 月份每周五工務會議提醒並催繳，並落實紀錄。(詳附件 6-3)。	107 年 9 月 21 日	

承包商 (工地負責人核章) 監造單位 (工地負責人核章) 主辦 (承辦人、長核章)

註：
1. 查證結果欄，由監造單位工地負責人逐項簽署；若屬主辦機關與監造單位之缺失項目，請由機關工程承辦人逐項簽署。
2. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任簽章。
3. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
4. 缺失改善資料未符規定者，將退回重新改正。

附件 2

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：■■■■■■■■■■ 新建工程
查核日期：107 年 8 月 22 日

第 1 頁共 23 頁

缺失項目 (含其他意見)	改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成 日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)
10. 【承攬廠商】 (1) 施工日誌未修正為最新規格。 (2) 主任技師到現場督導及指示事項，施工日誌未記載，未落實執行。	10. (1) 1. 原因分析：未發現已更新表格。 2. 矯正與預防措施：將定時注意表格更新情形，保持最新表格狀態。 3. 改善結果：已更新施工日誌最新表格(詳附件 10-1) (2) 1. 原因分析：當日施工日誌未記載未落實執行。 2. 矯正與預防措施：施工日誌將詳細記載督導情形(詳附件 10-2) 3. 改善結果：施工日誌將詳細記載督導情形(詳附件 10-2)	107.9.18 107.9.18	

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十四)改善對策及結果表- 查證結果欄未簽名。

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：[] 建工程
查核日期：107.6.21

第 1 頁共 9 頁

缺失項目 (含其他意見)	承包商：志偉營造有限公司 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成 日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請註明)
【主辦機關】應更動細則及整合各工項項目界面。 (4.01.20.01)	遵辦辦理，107年5月25日施工新建字第1070017888號函之工程圖說問題疑義。自來(107)年5月23日地、新工處、設計監造單位、及施工廠商等三方，進行圖說問題施工與圖說圖資研議釐清，俾利工造(附件1)。	107.7.7	工銀紀孫淵
【監造單位】廠商施工計畫審查核定日期與開工之緩方完。 (4.02.01.03)	1.原因分析：施工計畫提送核定太慢 2.矯正與預防措施：廠商應於開工前提送(106.0.32)核定。 3.改善結果：目前施工計畫於開工前已照規定送審定(107.9.5)不會影響施工(詳附件2)。	107.7.5	工銀紀孫淵
【監造單位】對檢驗報告判讀未落實執行(如107.5.30高工力學試驗報告)。 (4.02.03.0c)	1.原因分析：試驗報告未即時呈送判讀。 2.矯正與預防措施：對於承辦試驗報告落實呈送判讀。 3.改善結果：試驗報告判讀已改善判讀完畢。(詳附件3)。	107.7.5	工銀紀孫淵
【監造單位】施工進度監督未能發揮監督後進度改善。 單效果改善後進度仍未改善。(1.02.99)	1.原因分析：施工進度監督未能發揮監督後進度改善。 2.矯正與預防措施：進度落後時要求廠商立即改善進度。 3.改善結果：已改善完成。(詳附件4)。	107.7.5	工銀紀孫淵

查證結果欄未簽名

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：[] 案
查核日期：107年09月10日

第 3 頁共 6 頁

缺失項目	承包商：[] 土木包工業 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成 日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請註明)
5.【承攬廠商】品質自主檢查表未落實執行，量化不足。 (4.03.04) [L]	1.原因分析：僅以主觀感受之認定進行檢查制度，缺乏客觀之度量衡概念。 2.矯正與預防措施：改以數字量化之紀錄手法顯示自主檢查表之檢查結果。 3.改善結果：於原有紀錄上補充檢查結果內容。(詳附件4)	107.11.5	公羽 厚 蘇
6.【承攬廠商】連續磚施工流程有誤。(4.03.08.0E) [L]	1.原因分析：未檢查流程之合理性及實際可行性分析。 2.矯正與預防措施：落實流程規劃檢查制度。 3.改善結果：修改補充。(詳附件5)	107.11.5	公羽 厚 蘇

有逐項查證確認後簽名

(十五)改善對策及結果表-缺失未見附件。

第 4 頁 共 23 頁

已說明卻
未見附件

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十七)改善對策及結果表-文件類缺失未標示改善項目及範圍。

桃園市工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	桃園市[]空間改善工程			
主辦機關(課室)	桃園市[]	監造廠商	鉅開股份有限公司	
承攬廠商	[]程有限公司	相關廠商		
督導人員	[]	督導日期	107年7月27日	
工程執行進度	預定進度	100%	實際進度	97.71%
施工項目及工程進度之概述	1. 金鑼改善 2. 灰泥評估 3. 鋼桁架手架			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形: 皆到場 二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形: 未抽查 三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: 尚符規定 四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形: 屋頂相(B)螺絲圈距未改善 五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形: 無			
對承商指示事項	指示事項: 1. 請查核小組意見, 完成欠改善作業。 缺失改善期限: 限定107年8月7日提報	承商簽認	陳	
對監造單位指示事項	指示事項: 請監造單位提供查核意見書及承商改善確保完成改善, 並於107年8月7日前將改善結果函報本局。 缺失改善期限: 限定107年8月7日提報	監造簽認	黃	
主辦科室核章	承辦人員: []	科室主管: []		

未標示改善項目及範圍

桃園市工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	桃園市[]改善工程			
主辦機關(課室)	桃園市[]	監造廠商	鉅開股份有限公司	
承攬廠商	[]程有限公司	相關廠商		
督導人員	[]	督導日期	107年8月26日	
工程執行進度	預定進度	7.1%	實際進度	0%
施工項目及工程進度之概述	1. 預定進度, 新設面漆上噴。 2. 實際進度: 尚有尚未進場施工			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形: 皆到場 二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形: 未抽查 三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: 尚未進場施工, 未見圍籬及工程告示牌 四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形: 尚未進場施工 五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:			
對承商指示事項	指示事項: 1. 本案新設面漆工程, 應於107年8月20日前完工, 並呈報本局。 2. 尚未進場施工, 進度嚴重落後, 請儘速進場施工。 3. 請依契約規定確實填報施工日報。	承商簽認	陳	
對監造單位指示事項	指示事項: 1. 儘速提報施工計劃, 並於107年8月27日前報本局審核。 2. 應依契約規定每週提報監造回報, 並填報監造日報。 3. 本案監造人員, 未確實督促施工進度, 情節重大, 請儘速改善。	監造簽認	黃	
主辦機關核章	機關首長: []	科(室)室主管: []	承辦人員: []	

有以螢光筆標示改善項目及範圍

備註: 1. 本表由工程主辦機關科(課)室主管或承辦人員至工地現場督導使用。

備註: 1. 本表由工程主辦機關科(課)室主管或承辦人員至工地現場督導使用。
2. 本表一式三份由主辦機關(或主辦工程單位)、監造單位及承攬廠商各一份。

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十八)改善對策及結果表-不需逐頁核章。

工程查核改善對策及結果表												
標案名稱：106- 查核日期：107年4月12日												
第 1 頁共 1 頁												
缺失項目 (含其他意見)	承包商：承盈有限公司 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	監造： 完成日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)									
10. 無不合格及自主檢查表改善等資料。 (4.02.03.06)	10. 因無不合格品及自主檢查表改善表皆無缺失，故補上資料查驗。	107.4.23										
11. (1)施工日誌未落實執行。(2)品管自主檢查表未落實執行。 (4.03.03)	11. (1)施工日誌已落實執行，補上資料查驗。(2)品管自主檢查表已落實執行，補上資料查驗。											
12. 專任工程人員之督導紀錄表未落實記載。 (4.03.11.06)	12. 專任工程人員之督導紀錄表已落實記載，補上資料查驗。											
13. (1)自主檢查表過於簡單，無缺失改善的紀錄。(2)施工照片均未押日期。 (4.03.09)	13. (1)已將自主檢查表更新，參考新北市採購處建築類自主檢查表單類。(2)已在會議後拍攝的施工照片寫入拍照日期。											
不需逐頁核章												
僅需於末頁由三方核章即可												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>承包商</th> <th>監造單位</th> <th>主辦機關</th> </tr> <tr> <td>(工地負責人核章)</td> <td>(工地負責人核章)</td> <td>(承辦人、主管及機關首長核章)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				承包商	監造單位	主辦機關	(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(承辦人、主管及機關首長核章)			
承包商	監造單位	主辦機關										
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(承辦人、主管及機關首長核章)										

一、工程查核精進作為及常見錯誤態樣

• 常見錯誤態樣

(十九)改善對策及結果表-核章格式錯誤。

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：桃園市 中心新建工程
查核日期：107.3.28

第 頁共 頁

缺失項目 (含其他意見)	監造單位：		查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)
	改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成日期	
5. 106年3月監造計畫(核定版)，第六章施工抽驗程序及標準內缺失如下：(1)施工抽驗標準之格式不符合綱要表7.1規定及內容不符合本工程需求，且未包含機電工程(電梯除外)。	已補件，如附件五。	107.6.5	
13. 電機技師未審核品質計畫與施工計畫，且未簽認監造計畫。	品質計畫與施工計畫已請電機技師簽認，如附件十三。	107.6.5	
第二次查核： 請檢附電機技師審核之品質、施工計畫簽認稿，表及主辦機關核定公文後發。			
監造單位	監造單位主管	主辦機關	

核章格式錯誤

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：106年 (開口契約)
查核日期：107年02月26日

第 4 頁共 4 頁

缺失項目 (含其他意見)	承包商：營造有限公司		監造：工程顧問股份有限公司	
	改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)	
湖路一段676巷51弄15號，AC鋪面完成，遭加鋪水泥面，請另與抽驗送驗，以完成結算，避免影響驗收。	1. 原因分析：當地居民認為AC面層再加鋪水泥面會更耐用。 2. 矯正與預防措施：依建議辦理，該工程訂於107年3月9日辦理驗收，於該區域驗收時指定抽驗1組。 3. 改善結果：如附件(11)107年3月9日驗收情形(鑽心照片)。	107.3.9		
湖路(佛恩寺附近)路口，路面旁有滲水情形，請後再予觀察，避免影響使用需求。	1. 原因分析：不明原因所發生之情事。 2. 矯正與預防措施：依建議辦理，請道路巡修人員定期前往巡修觀察是否有滲水情形，如持續發現滲水，將辦理區域切割改善。 3. 改善結果：如附件(12)107年3月9日修照	107.3.9 107.3.19		
承包商	監造單位	主辦機關		
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(承辦人、主管及機關首長核章)		

受查廠商有核
公司大小章

主辦機關有逐級
核章至機關首長

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

簡介

- 桃園市政府為落實所屬機關工程品質督導，以提升公共工程品質，特訂定督導小組設置及作業要點。
- 每年第一季，本府辦理前一年度工程督導小組考評，並由本府設置之工程品質督導小組績效考核委員會，辦理各設置機關督導小組年度績效考核成績評比等事宜。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

作業要點調整起因

- 因本市施工單位及工程案量變動甚大，各局處多項工程待發包施作，且106年度增加辦理部分機關督導考評作業，為達年度考評之公正性，酌修本要點規定。
- 107年度先新增部分工程案量較大之局處，並將考核指標調整為工程會近年重點項目。
- 108年度擬再依本市所屬機關工程發包施作狀況，將有施作工程之機關全數納入考核，並分類為工程及非工程機關。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

1. 受考評機關

修正前	修正後
工務局、水務局、觀光旅遊局、都發局、交通局、教育局、警察局、文化局及本市各區公所。	工務局、水務局、觀光旅遊局、都發局、交通局、教育局、警察局、文化局、 捷運工程局、新建工程處、養護工程處 及本市各區公所。

★以上單位除依要點規定需設置督導小組外，每年且應予接受主管機關考評。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(1)督導件數

修正前

至少達機關年度發包件數(僅含公告金額以上工程)之百分之十五(若有小數則無條件進位)，或10件。預算金額1,000萬以下工程需占年度總督導件數之百分之六十以上(若有小數則無條件進位)。

修正後

至少達機關年度發包件數(僅含公告金額以上工程)之百分之十五(若有小數則無條件進位)，0~8分。

☆達成最低標10件或是15%。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(2)督導紀錄彙整之完整性

修正前

- 1) 個別督導委員之原始查核紀錄是否具體、嚴謹及合理。
- 2) 督導紀錄是否確實整合督導委員之查核結果，且內容明確、具體。
- 3) 相關督導資料之妥適性及完整性。
- 4) 文件紀錄管理。
- 5) 有無確實將督導填入標案管理系統。

修正後(維持原指標)

- 1) 個別督導委員之原始查核紀錄是否具體、嚴謹及合理，**0~3分**。
- 2) 督導紀錄是否確實整合督導委員之查核結果，且內容明確、具體，**0~3分**。
- 3) 相關督導資料之妥適性及完整性，**0~3分**。
- 4) 文件紀錄管理，**0~1分**。
- 5) 有無確實將督導填入標案管理系統，**0~2分**。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(3)督導缺失改善之審核與追蹤

修正前

- 1)缺失改善是否按期完成或逾期稽催。
- 2)缺失改善審查之嚴謹度。
- 3)改善佐證文件之完整性。
- 4)檢附改善照片或說明之完整性。

修正後(維持原指標)

- 1)缺失改善是否按期完成或逾期稽催，0~6分。
- 2)缺失改善審查之嚴謹度，0~3分。
- 3)改善佐證文件之完整性，0~3分。
- 4)檢附改善照片或說明之完整性，0~3分。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(4)督導小組運作與高階長官參與情形

修正前

- 1)督導小組人員(不含督導委員)之專業背景及人數等情形。
- 2)督導小組召集人或執行秘書積極參與督導小組運作程度（如公文之審閱、參與督導作業或會議等）。

修正後(維持原指標)

- 1)督導小組人員(不含督導委員)之專業背景及人數等情形，0~5分。
- 2)督導小組召集人或執行秘書積極參與督導小組運作程度（如公文之審閱、參與督導作業或會議等），0~5分。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(5)工程執行進度

修正前

~~本府工程施工查核機關之案件，是否有落後之情形。(以本府工程施工查核紀錄為準)~~

修正後

(刪除此項)

- ①本府工程施工查核於進行查核選案作業時，工程執行落後為篩選之必要條件。
 - ②工程執行進度為查核計分時之重要項目。
 - ③績效考核指標(6)項已針對查核分數與扣點情形進行評分。
- 為避免重複計分，本項刪除。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(5)外聘督導委員遴派情形

修正前	修正後
1) 原則為一案一位外聘委員。 2) 是否有考量其專業背景與受督導工程之契合情形。 3) 是否辦理外聘委員評量。	1) 是否有考量其專業背景與受督導工程之契合情形， 0~5分。 2) 是否辦理外聘委員評量， 0~5分。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

調整內容

2.績效考核指標

~~(7)缺失重複發生情形~~

修正前
本府工程施工查核機關之案件，缺失重複發生情形。(以本府工程施工查核紀錄為準)

修正後
(刪除此項)

- ①工程施工查核已於查核時針對缺失項目進行評分。
- ②績效考核指標(6)項亦已針對查核分數與扣點情形進行評分。為避免重複計分，本項刪除。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案) 調整內容

2.績效考核指標

(6)本府工程施工查核之查核分數與扣點

修正前	修正後(維持原項)
本府工程施工查核機關之案件，查核分數與扣點情形。(以本府工程施工查核紀錄為準)	本府工程施工查核機關之案件，查核分數與扣點情形， 0~10分 。 (以本府工程施工查核紀錄為準) ☆ 平均查核分數、甲等、丙等、扣點.....等。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

107年度調整內容

2.績效考核指標

(7)受施工查核缺失改善情形

新增

- 1) 受施工查核之案件缺失，機關改善結案天數。(以年度受查案件平均改善天數計)，**0~15分**。
☆以缺失改善**40天**為標準，每增加1天扣**0.1**分，扣完為止。
- 2) 缺失改善未在期限內回覆，有無申請展期，其理由是否充分，**0~5分**。
☆未獲展期同意每次扣**1**分，扣完為止。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案)

調整內容

2.績效考核指標

(8)督導結果及回饋至制度面之推動情形

修正前

- 1) 是否檢討工程督導常見缺失，並回饋至制度面或其他類似案件（如提檢討報告、訂定相關罰則，或修改契約、規範及規定等）。
- 2) 督導結果是否定期於首長會報或區務會議提報檢討。
- 3) 是否定期召開督導檢討會、辦理教育訓練或工程觀摩等提昇品質作法。

修正後

- 1) 是否檢討工程督導常見缺失，並回饋至制度面或其他類似案件（如提檢討報告、訂定相關罰則，或修改契約、規範及規定等），**0~3分**。
- 2) 督導結果是否定期於首長會報或區務會議提報檢討，**0~2分**。
- 3) 是否有辦理開工前講習會及施工說明會，**0~2分**。
- 4) 是否定期召開督導檢討會、辦理教育訓練或工程觀摩等提昇品質作法，**0~3分**。

二、「督導小組績效考核要點」修訂(草案) 調整內容

2.績效考核指標 (9)其他特殊績效

修正前	修正後
是否提報可彰顯該機關督導運作機制之績效展現成果(如創新性、克服困難等)。	是否提報可彰顯該機關督導運作機制之績效展現成果(如參與各類比賽及創新性、克服困難等)，0~15分。 1) 訂立、修訂要點、注意事項，0~2分。 2) 辦理工程品質講習會、觀摩會或督導業務檢討會，0~2分。 3) 督導結果定期或不定期提報主管會報，0~1分。 4) 參加金質獎、金安獎、金品獎，0~7分。 5) 配合本小組政策作為(例如工程卓越獎...等)，0~3分。

二、「督導小組績效考核要點」修訂

108年度績效考核時程

- ★ 績效考核時間發文：108年1月上旬
(公告流程、考核時間順序)
- ★ 績效考核現地考評：108年1月下旬
(暫訂1/28.29.31舉辦)

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

修正對照表-要點第一項

修正規定	現行規定	說明
桃園市政府（以下簡稱本府）為提升公共工程施工品質，改善生活環境，促進廠商良性競爭，並表揚本市優良公共工程之主辦機關、 <u>代辦機關</u> 及廠商，特訂定本要點。	桃園市政府（以下簡稱本府）為提升公共工程施工品質，改善生活環境，促進廠商良性競爭，並表揚本市優良公共工程之主辦機關及廠商，特訂定本要點。	增加代辦機關

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

修正對照表-要點第二項

修正規定	現行規定	說明
工程規模分為下列等級： (一)第一級： <u>採購金額為新臺幣十億元以上之工程。</u> (二)第二級： <u>採購金額為巨額採購以上未達新臺幣十億元之工程。</u> (三)第三級： <u>採購金額為查核金額以上未達巨額採購之工程。</u> (四)第四級： <u>採購金額為新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程。</u> (五)第五級： <u>採購金額為公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程。</u>	工程規模分為下列等級： (一)第一級：巨額採購之工程。 (二)第二級：採購金額為查核金額以上未達巨額採購之工程。 (三)第三級：採購金額為公告金額以上未達查核金額之工程。	參賽工程規模依採購金額由原本的三級分為五級

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

修正對照表-要點第六項

修正規定	現行規定	說明
本府所屬各機關辦理之公共工程於前一年四月一日至當年三月三十一日前施工中或完工者，未曾獲公共工程金品獎且符合下列條件，經主辦機關以書面向本會提出推薦，得參加當年度評選： (一)曾受中央或本府工程施工查核小組查核成績甲等以上。 (二)經主辦機關認定足堪為本府工程表率。	本府所屬各機關辦理之公共工程於前一年四月一日至當年三月三十一日前施工中或完工者，未曾獲公共工程金品獎且符合下列條件 <u>之一</u> ，經主辦機關以書面向本會提出推薦，得參加當年度評選： (一)曾受中央或本府工程施工查核小組查核成績甲等以上。 (二) <u>曾受各機關之工程督導小組督導並推薦參加評選</u> 。 (三)經主辦機關認定足堪為本府工程表率。	原第二款推薦條件刪除

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

修正對照表-要點第七項

修正規定	現行規定	說明
(四)施工期間因違反環境保護法規，受主管機關處全部停工一次以上或部分停工二次以上之處分，或遭裁處罰鍰累計<u>達</u>下列金額： 1、<u>巨額採購工程</u>達新臺幣一百萬元。 2、<u>查核金額以上未達巨額採購之工程</u>達新臺幣三十萬元。 3、<u>未達查核金額之工程</u>達新臺幣十萬元。	(四)施工期間因違反環境保護法規或<u>職業安全衛生法規</u>，受主管機關處全部停工一次以上或部分停工二次以上之處分，或遭裁處罰鍰累計<u>逾</u>下列金額： 1、第一級工程：新臺幣一百萬元。 2、第二級工程：新臺幣三十萬元。 3、第三級工程：新臺幣十萬元。	1.刪除因違反職業安全衛生法規遭處停工者之參賽資格限制。 2.修正裁處罰鍰累計金額部份以採購金額級距重新區分。

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

修正對照表-要點第九項

修正規定	現行規定	說明
參選工程由本會委員視工程之設計、監造、專案管理、承攬廠商(含分包廠商)或主辦機關對品質提昇之貢獻度，提出建議獲獎名單，經本會決議後給獎，必要時得從缺。 獲獎廠商及主辦機關之獎勵如下： (一)總平均分數八十五分以上未達九十分評定為優等者，頒發獎狀一幀；總平均分數九十分以上評定為特優者，頒發獎座一座及獎狀一幀。 (二)獲獎機關得依據相關獎懲規定對承辦人員敘獎，並得優先列為本府模範公務人員候選人。 (三)獲獎廠商於獎勵期間內參加本府各機關之採購，適用下列獎勵措施： 1、招標方式採公開評選之採購，主辦機關應將優良事蹟列為評選項目加分參考。 2、押標金、履約保證金及保固保證金得減收百分之五十。 前項第三款所稱獎勵期間自獎狀所載日期起算，評定特優及優等者，獎勵期間為二年；評定佳作者，獎勵期間為一年。 <u>第一項分包廠商應由得標廠商依政府採購法第六十七條第二項規定辦理，且該分包廠商之分包比率需達契約金額百分之二十五以上。</u>	參選工程由本會委員視工程之設計、監造、專案管理、承攬廠商或主辦機關對品質提昇之貢獻度，提出建議獲獎名單，經本會決議後給獎，必要時得從缺。 獲獎廠商及主辦機關之獎勵如下： (一)總平均分數八十五分以上未達九十分評定為優等者，頒發獎狀一幀；總平均分數九十分以上評定為特優者，頒發獎座一座及獎狀一幀。 (二)獲獎機關得依據相關獎懲規定對承辦人員敘獎，並得優先列為本府模範公務人員候選人。 (三)獲獎廠商於獎勵期間內參加本府各機關之採購，<u>招標機關應於招標文件中載明</u>適用下列獎勵措施： 1、招標方式採公開評選之採購，主辦機關應將優良事蹟列為評選項目加分參考。 2、押標金及履約保證金得減收百分之五十。 前項第三款所稱獎勵期間自獎狀所載日期起算，評定特優等者，獎勵期間為二年；評定優者，獎勵期間為一年。	1.第一項：承攬廠商增列分包廠商並增加第三項分包廠商之條件。 2.刪除第一項第三款招標機關應於招標文件中載明之文字，並增加第二目保固保證金得減收百分之五十。 3.第二項增加優等獎勵時間為二年及增加佳作者為一年。

三、「金品獎評選及獎勵作業要點」修訂

108年度「金品獎評選」注意事項及重要期程

- 1、108年2月28日前以書面向本會提出
- 2、三月底前召開初選會議
- 3、六月底前，辦理實地勘查參加決選之工程
- 4、七月底前，核定得獎工程名單
- 5、八月底前公布得獎名單及頒發公共工程金品獎

The background is a solid yellow color with decorative floral and leaf patterns in a slightly darker shade of yellow. The patterns are concentrated on the left side and bottom, with some faint, larger-scale patterns across the entire surface.

簡報結束
敬請指教
